



Interreg

Austria-Hungary

European Union – European Regional Development Fund

Fairwork



3. Lenkungsausschusssitzung des Projekts Fairwork

3. Irányítóbizottsági ülés – Fairwork Projekt

Inhalt

Projektfortschritt nach Modulen

Indikatoren

Probleme, Herausforderungen

Prüfberichte

Geplante Maßnahmen 2019

Tartalom

Előrehaladás modulonként

Indikátorok

Problémák, kihívások

Ellenőrzés

Tervezett tevékenységek, 2019

Projektfortschritt nach Modulen

P Vorbereitung	M Management
T1 Studie	T2 Institutionelle Kooperation
T3 Know-How Transfer	C Kommunikation

Projektelőrehaladás modulonként

P Előkészítés	M Menedzsment
T1 Tanulmány	T2 Intézményi együttműködés
T3 Know-How transfer	C Kommunikáció

Projektfortschritt nach Modulen

Vorbereitung

Laufzeit im Projekt

- 2015 - 2016

Maßnahmen

- Partnerbesprechungen ÖGB – MaSZSZ
- Koordinierungsbesprechungen mit Regionalmanagement Burgenland sowie mit Széchenyi Programiroda
- Kontaktaufnahme mit strategischen Partnern
- Sammeln und Aufarbeitung von Informationen
- Besprechungen mit der Abteilung Projektmonitoring und Förderwesen des ÖGB

Fortschritt des Moduls

- Abgeschlossen

Projektelőrehaladás modulonként

Előkészítés

Futamideje a projekten belül

- 2015 - 2016

Tevékenységek

- Partnermegbeszélések (ÖGB – MaSZSZ)
- Koordinációs megbeszélések az RMB-vel és Széchenyi Programirodával
- Kapcsolatfelvétel a stratégiai partnerekkel
- Információgyűjtés és –feldolgozás
- Megbeszélések az ÖGB „Projektmonitoring und Förderwesen“ osztályával

A modul előrehaladása

- Lezárult

Projektfortschritt nach Modulen

Management

Laufzeit im Projekt

- 2017 - 2019

Maßnahmen

- Inbetriebnahme der Projektbüros (Szombathely, Eisenstadt, Oberwart)
- Projektmanagement-Handbuch
- Projektkoordinierungs-Sitzungen
- Lenkungsausschuss-Sitzungen
- Berichtslegung auf Partner- und Projektebene

Fortschritt des Moduls

- Laufend, entsprechend Zeitplan

Projektelőrehaladás modulonként

Menedzsment

Futamideje a projekten belül

- 2017 - 2019

Tevékenységek

- A projektirodák kialakítása (Szombathely, Eisenstadt, Oberwart)
- Projektmenedzsment-kézikönyv
- Projektkoordinációs ülések
- Irányítóbizottsági ülések
- Jelentéstétel partner- és projektszinten

A modul előrehaladása

- Folyamatban, az időtervnek megfelelően

Projektfortschritt nach Modulen

Management

Inbetriebnahme der Projektbüros

- Jänner 2017 – März 2017
- Standorte: Szombathely, Eisenstadt, Oberwart
- Projektpersonal: 4 Personen (2 in Österreich, 2 in Ungarn): Vollzeit, zu 100% im Projekt
- Büroausstattung: Projektträger stellt zur Verfügung
- Technische Ausstattung wurde gekauft: PC oder Notebook, Multifunktionsgerät (Scanner, Drucker, Kopierer)

Projektelőrehaladás modulonként

Menedzsment

A projektirodák kialakítása

- 2017. január - március
- Helyszínek: Szombathely, Eisenstadt, Oberwart
- Projekt munkatársak: 4 fő (2 Ausztriában, 2 Magyarországon), teljes munkaidőben, 100%-ban projekt
- Irodafelszerelés: a projektgazda biztosítja
- Technikai felszerelés került beszerzésre: PC vagy notebook, többfunkciós nyomtató (szkenner, nyomtató, fénymásoló)

Projektfortschritt nach Modulen

Management

Projektmanagement Handbuch

- Festlegung der Details der Zusammenarbeit der Projektpartner (ÖGB, MaSZSZ)
- Aufgaben, Zuständigkeiten, Abläufe im Projekt
- Aufgaben der Berichtslegung auf Partner- und Projektebene
- Ziel: Reibungslose Umsetzung entsprechend des Projektplans sicherstellen

Projektelőrehaladás modulonként

Management

Projektmanagement-kézikönyv

- A projektpartnerek (ÖGB, MaSZSZ) együttműködése részleteinek rögzítése
- Feladatok, Illetékességek, projekt folyamatok
- A partner- és projektszintű jelentéstételi feladatok
- Cél: a projekttervnek megfelelő, zökkenőmentes megvalósítás biztosítása

Projektfortschritt nach Modulen

Management

Projektkoordinierungs-Sitzungen

Ziel

- Koordinierung der Maßnahmenplanung- und Umsetzung
- Laufende Projektmanagement-Kommunikation
- Teilnahme von allen 4 ProjektmitarbeiterInnen

Fortschritt

- Projektplan: mindestens 1x alle 6 Monate
- Bislang: 23 Sitzungen
- Laufend, entsprechend Projektplan

Projektelõrehaladás modulonként

Menedzsment

Projektkoordinációs ülések

Cél

- A projekttevékenységek tervezésének és megvalósításának koordinálása
- Folyamatos projektmenedzsment kommunikáció
- Mind a 4 projektmunkatárs részvételével


Elõrehaladás

- Projektterv szerint: legalább 1-szer félévente
- Eddig: 23 ülés
- Folyamatos, a projekttervnek megfelelően


Projektfortschritt nach Modulen Management

Projektelőrehaladás modulonként Menedzsment

Projektkoordinierungs-Sitzungen

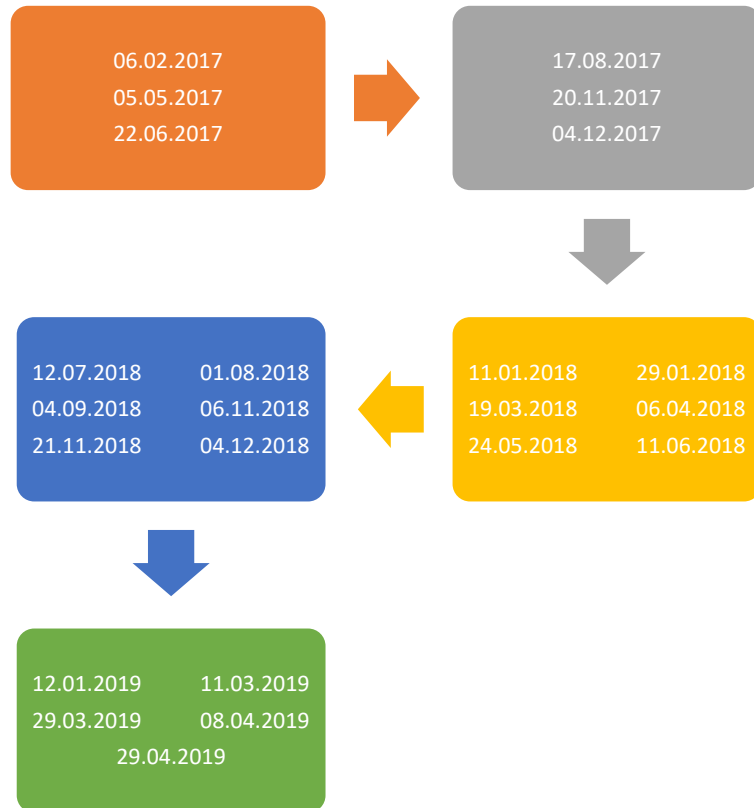

Projektkoordinációs ülések

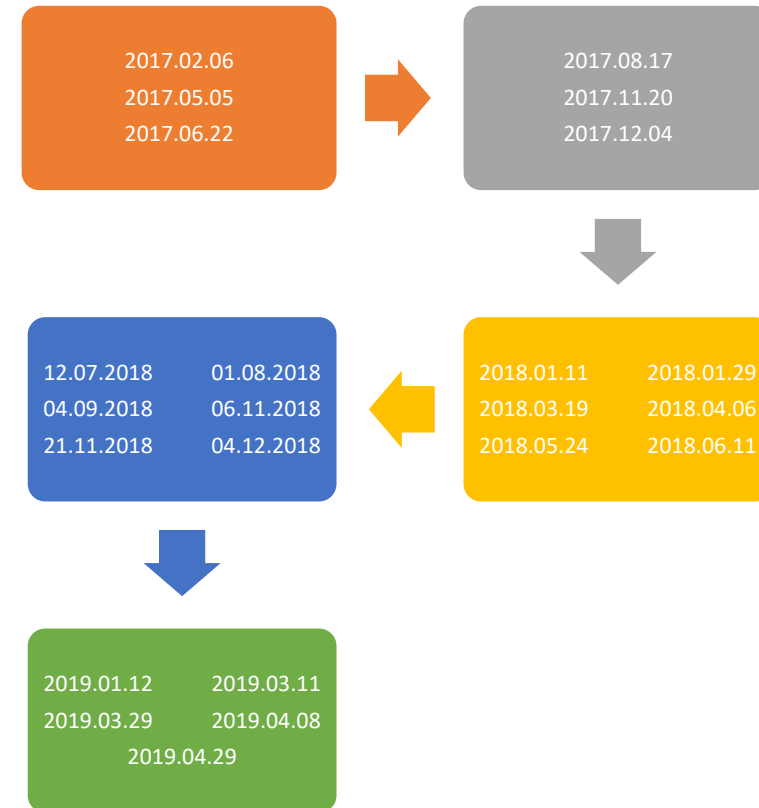

Projektfortschritt nach Modulen Management

Projektelőrehaladás modulonként Menedzsment

Projektkoordinierungs-Sitzungen



Projektkoordinációs ülések



Projektfortschritt nach Modulen

Management

Lenkungsausschuss-Sitzungen

Ziel

- Koordinierung der Maßnahmenplanung- und Umsetzung mit den strategischen Partnern
- Präsentation des Projektfortschritts and die strategischen Partnern
- Teilnahme von allen Projekt- und strategischen Partnern (Österreich und Ungarn)

Fortschritt

- Projektplan: 1x im Jahr
- Bislang: 3 Sitzungen (18.10.2017, 09.11.2018, 15.05.2019)
- Laufend, entsprechend Projektplan

Projektelőrehaladás modulonként

Menedzsment

Irányítóbizottsági ülések

Cél

- A projekttevékenységek tervezésének és megvalósításának koordinálása a stratégiai partnerekkel
- A projektelőrehaladás bemutatása a stratégiai partnerek felé
- Résztvevők: az összes projektpartner és stratégiai partner (Ausztria és Magyarország)

Előrehaladás

- Projektterv szerint: 1-szer évente
- Eddig: 3 ülés (2017.10.18, 2018.11.09, 2019.05.15)
- Folyamatos, a projekttervnek megfelelően

Projektfortschritt nach Modulen
Management

Projektelőrehaladás modulonként
Menedzsment

Lenkungs Ausschuss-Sitzungen

Irányító bizottsági ülések



Projektfortschritt nach Modulen

Management

Berichtslegung

Berichte

- Halbjährliche Fortschrittsberichte auf Partnerebene
- Zusammenfassung in halbjährliche Projektberichte
- In elektronischer Form (keine Druckversion)
- Tätigkeits- und Finanzbericht in einem
- Lead Partner verantwortlich für die Berichtslegung

Fortschritt des Moduls

- Laufend, entsprechend Zeitplan (5-5 Partnerberichte und 4 Projektberichte eingereicht)

Projektelőrehaladás modulonként

Menedzsment

Jelentéstétel

Jelentések

- Félévenkénti előrehaladási jelentések partnerszinten
- A partnerjelentések összefoglalása félévenkénti projektjelentésekbe
- Elektronikus formátum (nincsen nyomtatható változat)
- Tevékenységi- és pénzügyi jelentés egyben
- A Lead Partner felelős a jelentéstételért

A modul előrehaladása

- Folyamatban, az időtervnek megfelelően (5-5 partnerszintű jelentés és 4 projektjelentés került benyújtásra)

Projektfortschritt nach Modulen

Studie

Laufzeit im Projekt

- Februar 2017 – April 2018

Maßnahmen

- Befragung von GrenzpendlerInnen und ArbeitnehmerInnen in Ungarn (Vergleich)
- Interviews mit arbeitsmarktrelevanten BehördenvertreterInnen
- Analyse und Auswertung der Fragebögen und Erstellung der Studie
- Erstpräsentation im Herbst 2017 / Rückmeldungen / Endpräsentation im April 2018

Fortschritt des Moduls

- Abgeschlossen

Projektelőrehaladás modulonként

Tanulmány

Futamideje a projekten belül

- 2017. február – 2018. április

Tevékenységek

- Határon át ingázó munkavállalók és Magyarországon dolgozó munkavállalók (összehasonlítás) kérdőíves felmérése
- Interjúk munkaerőpiaci szempontból releváns hatóságok képviselőivel
- A kérdőívek elemzése és kiértékelése, illetve a tanulmány elkészítése
- 2017 őszén az első eredmények bemutatása / visszajelzések / kész tanulmány bemutatása 2018. április

A modul előrehaladása

- Lezárult

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

Laufzeit im Projekt

- 2017 – 2019

Bereiche

- ArbeitnehmerInnenschutz
- Beschäftigung, Arbeitslosigkeit
- Krankenversicherung
- Pensionsversicherung
- Familienleistungen (Familienbeihilfe, KBG)
- ArbeitnehmerInnenveranlagung

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

Futamideje a projekten belül

- 2017 – 2019

Területei

- Munkavédelem
- Foglalkoztatás, munkanélküliség
- Egészségbiztosítás
- Nyugdíjbiztosítás
- Családi ellátások (családi pótlék, GYES)
- Munkavállalói adóbevallás

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

ArbeitnehmerInnenschutz „Dacharbeiten“

Maßnahmen

- 09.02.2017 - Arbeitsgruppensitzung
- 20.03.2017 – Arbeitsgruppensitzung
- 08.05 und 10.05.2017 - Pressekonferenzen
- 09.05.2017 – Infoabend in Deutschkreutz
- 12.05.2017 – Infoveranstaltung AUVA, Oberwart
- 09.05.2018 – Ergebnispräsentation der Infokampagne

Fortschritt des Moduls

- Abgeschlossen

Projektelõrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

Munkavédelem „Tetőn végzett munkák“

Tevékenységek

- 09.02.2017 – Munkacsoport ülés
- 20.03.2017 – Munkacsoport ülés
- 08.05 und 10.05.2017 - Sajtótájékoztatók
- 09.05.2017 – Információs est, Deutschkreutz
- 12.05.2017 – Információs rendezvény AUVA, Oberwart
- 09.05.2018 – A tájékoztató kampány eredményeinek bemutatása

A modul előrehaladása

- Lezárult

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

Gespräche mit strategischen Partnern

Maßnahmen

- 21.02.2018 - Győr
- 22.02.2018 – Zalaegerszeg
- 23.02.2018 - Szombathely

Projektelőrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

Megbeszélések a stratégiai partnerekkel

Tevékenységek

- 21.02.2018 - Győr
- 22.02.2018 – Zalaegerszeg
- 23.02.2018 - Szombathely

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

Thema Kinderbetreuungsgeld

Maßnahmen

- 07.04.2017 – Arbeitsgruppensitzung
 - Änderungen bei der Antragstellung in Österreich
 - Kontakte (Österreich / Ungarn)

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

GYES

Tevékenységek

- 07.04.2017 – munkacsoport ülés
 - Változások a kérelmezésben (Ausztria)
 - Kapcsolatok (Ausztria / Magyarország)

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

Thema Beschäftigung

Maßnahmen

- 08.08.2018 – Arbeitsgruppensitzung in Eisenstadt
- 17.10.2018 – Kooperationstreffen, AMS Eisenstadt
- 14.11.2018 – Arbeitsgruppensitzung in Sopron
- 17.04.2019 – Arbeitsgruppensitzung in Szombathely

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

Foglalkoztatás

Tevékenységek

- 08.08.2018 – munkacsoport ülés, Eisenstadt
- 17.10.2018 – Kooperációs találkozó, AMS Eisenstadt
- 14.11.2018 – munkacsoport ülés, Sopron
- 17.04.2019 – munkacsoport ülés, Szombathely

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

Thema Familienbeihilfe, ANV

Maßnahmen

- 03.10.2018 – Kooperationsitzung in Szombathely
- 31.01.2019 – Arbeitsgruppensitzung, Eisenstadt
- 04.04.2019 – Arbeitsgruppensitzung, Győr

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

Családi pótlék, munkavállalói adóbevallás

Tevékenységek

- 03.10.2018 – kooperációs találkozó, Szombathely
- 31.01.2019 – munkacsoport ülés, Eisenstadt
- 04.04.2019 – munkacsoport ülés, Győr

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Institutionelle Kooperation

Thema Sozialversicherung

Maßnahmen

- 10.10.2018 –
Kooperationssitzung in
Eisenstadt

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Intézményi együttműködés

Egészségbiztosítás

Tevékenységek

- 2018.10.10 – Kooperációs
ülés Eisenstadtban

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Know-How Transfer

Laufzeit im Projekt

- 2018 – 2019

Bereiche

- MultiplikatorInnenschulungen
 - Herbst 2018
 - 23 TeilnehmerInnen
 - 5 Einheiten

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Know-How transfer

Futamideje a projekten belül

- 2018 – 2019

Területei

- Multiplikátor képzések
 - 2018. október-november
 - 23 résztvevő
 - 5 oktatási egység

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Kommunikation

Laufzeit im Projekt

- 2017 – 2019

Bereiche

- Kommunikationsstrategie
- Projektwebseite (<https://www.interreg-athu.eu/fairwork>)
- Projektbroschüre
- Informationsbroschüren
- Pressekonferenzen
- Informationsveranstaltungen
- Social Media: Facebook, Youtube

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Kommunikáció

Futamideje a projekten belül

- 2017 – 2019

Területei

- Kommunikációs stratégia
- Projekthonlap
- Projektkiadvány
- Információs kiadványok
- Sajtótájékoztatók
- Információs rendezvények
- Social Media: Facebook, Youtube

A modul előrehaladása

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Kommunikation

Pressekonferenzen

- Dacharbeiten: 08.05.2017, 10.05.2017
- Kooperationsvereinbarungen: 24.07.2017, 25.07.2017, 29.05.2017
- Studienpräsentation: 12.04.2018

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Kommunikáció

Sajtótájékoztatók

- Tetőn végzett munkák: 2017.05.08, 2017.05.10
- Együttműködési megállapodások: 2017.07.24, 2017.07.25, 2017.05.29
- Tanulmány bemutatása: 2018.04.12

Előrehaladás

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Kommunikation

Broschüren

- Infobroschüre „Grenzenlose Sicherheit“
- Projektbroschüre
- Flyer „Familienbonus Plus“
- Infoblatt E106
- Infoblatt „Indexierung“

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Kommunikáció

Kiadványok

- Információs kiadvány „Határtalan biztonság“
- Projektkiadvány
- Flyer „Familienbonus Plus“
- Információs lap E106
- Információs lap „Indexálás“

Előrehaladás

- Folyamatos

Projektfortschritt nach Modulen

Kommunikation

Online-Medien

- Facebook: seit 2017
- Projektwebseite seit 2018
- Youtube

Fortschritt des Moduls

- Laufend

Projektelőrehaladás modulonként

Kommunikáció

Online média

- Facebook: 2017 óta
- Projekthonlap 2018 óta
- Youtube

Előrehaladás

- Folyamatos

Indikatoren

Gemessen wird

- Projektspezifische Ziele
 - Verbesserte Kooperationsstrukturen
 - Effektivere Kommunikation
- Projektoutputs
 - Akteure (20/13)
 - Gemeinsame Veranstaltungen (5/1)
- Erreichte Zielgruppen (85%)

Indikátorok

Mérőszámok

- Projektspecifikus célok
 - kooperációs struktúrák fejlesztés
 - Hatékonyabb kommunikáció
- Projektkimenetek
 - Szereplők (20/13)
 - Közös rendezvények (5/1)
- Elért célcsoportok (85%)

Probleme, Herausforderungen



- Vertragsabschluss
- Berichtswesen
- Gemeinsame Ziele finden
- Projektadministration
- Webseite

Problémák kihívások



- Szerződéskötés
- Jelentéstétel
- Közös célokat találni
- Projektadminisztráció
- Honlap

Prüfberichte

Stand: 30.04.2019

- Partnerberichte (Österreich): 0-4 zertifiziert
- Partnerberichte (Ungarn): 0-3 zertifiziert
- Projektberichte 0-3 zertifiziert
- Aktuell 99,97% der eingereichten Projektkosten genehmigt

Ellenőrzés

Állapot: 2019.04.30

- Partnerszintű jelentések (Ausztria): 0-4 elfogadva
- Partnerszintű jelentések (Magyarország): 0-3 elfogadva
- Projektszintű jelentések: 0-3 elfogadva
- Aktuálisan a benyújtott projektköltségek 99,97%-a elfogadva
